PMO: Administrar Proyectos de TI. LEGISLACION
Plan de Dirección del Proyecto - Modelo Explicado.
Grupo: Qwerty-123.

Información general del Proyecto.

Campo	Contenido
Organización	Desarrollos y Servicios de TI — Grupo QWERTY123
Proyecto	GastoSmart — Planificación del desarrollo de un MVP funcional para el control de gastos personales
Fecha de preparación	05/10/2026
Cliente	Proyecto académico del grupo QWERTY123, sin cliente externo definido
Responsable del proyecto	Tomás Andrés
Lista de colaboradores	Omar Contreras, Paul Romero, Fernando Adaro, Rodriguez Gustavo, Santarena Agustin, Santarena Gabriel, Martin Santiago y Spikerman Nahuel

Alcance del Proyecto:

Especificaciones / Características	Criterios de aceptación / Medio de verificación	Normativas / Estándares / Modelos / Marcos de trabajo
Definir y documentar los requisitos del MVP de GastoSmart, orientado al registro manual y al control de gastos personales.	Los requisitos deben describir el funcionamiento esperado y delimitar qué se incluye y qué queda fuera. Verificación mediante revisión del documento por el responsable del proyecto.	Modelo Canvas y documentación del MVP del grupo QWERTY123.
Planificar y organizar el desarrollo, estableciendo actividades, entregables, fechas y responsabilidades del equipo.	Cada actividad debe contar con un entregable, fechas previstas y responsables identificados. Verificación mediante revisión del cronograma y de la matriz RACI.	Plan para la Dirección del Proyecto proporcionado por líder de grupo.

Desarrollar y verificar un MVP funcional conforme a los requisitos acordados.	El MVP debe permitir completar el registro manual y la consulta de gastos definidos en los requisitos. Verificación mediante pruebas funcionales y registro de sus resultados.	Modelo de calidad de software citado en la documentación del proyecto.
Definir y documentar medidas de protección de datos y seguridad de la información para el MVP.	Deben identificarse los datos necesarios, las reglas de acceso y las medidas previstas para protegerlos. Verificación mediante revisión de requisitos y evidencias de las medidas implementadas.	Ley N.º 25.326 e ISO/IEC 27001 y 27002, como referencias identificadas en el documento base.
Mantener organizada y actualizada la documentación durante el desarrollo del proyecto.	Los documentos deben indicar su versión y permitir identificar los cambios y las revisiones realizadas. Verificación mediante revisión del historial documental.	Proceso de gestión documental definido por el grupo QWERTY123.

Alcance del producto:

Especificaciones / Características	**Criterios de aceptación**	**Medio de verificación**
Registro manual de gastos personales.	El usuario debe poder ingresar y guardar un gasto con su importe, fecha y descripción. Los datos obligatorios deben estar completos y el importe debe ser mayor que cero.	Pruebas de registro con datos válidos, campos incompletos e importes incorrectos.
Consulta de los gastos registrados.	El usuario debe poder visualizar los gastos guardados con sus datos correspondientes.	Registrar gastos de prueba y comparar la información ingresada con la que muestra la aplicación.
Visualización del total de gastos registrados.	El total mostrado debe coincidir con la suma de los importes de los gastos incluidos en la consulta.	Comparar el total de la aplicación con un cálculo manual utilizando datos de prueba.
Interfaz comprensible para registrar y consultar gastos.	Un usuario de prueba debe poder completar ambas tareas sin ayuda del equipo, siguiendo las indicaciones de la interfaz.	Prueba de uso y registro de dificultades observadas.

Exclusiones:

Elemento excluido	Descripción
Lectura automática de notificaciones del dispositivo	El MVP actual no incluye la lectura de notificaciones de aplicaciones bancarias para detectar y registrar gastos automáticamente. Los gastos se registran manualmente por el usuario. Esta funcionalidad se considera una posible mejora futura.
Versión definitiva de GastoSmart	Esta etapa no comprende la entrega de una versión definitiva de la aplicación. Se trabaja en un MVP cuyo diseño constituye un avance representativo y puede modificarse en etapas posteriores.


Restricciones:

Restricción	Descripción
Tiempo de realización	Las actividades del proyecto deben ajustarse a los plazos de entrega establecidos por el cliente.
Recursos humanos	El trabajo se realizará con los integrantes del grupo QWERTY123, distribuyendo las tareas según su disponibilidad y conocimientos.
Alcance de esta etapa	El desarrollo y la documentación se limitan al MVP definido, con registro manual de gastos. Las mejoras futuras requieren una nueva planificación.
Protección de la información	El diseño del MVP debe contemplar la protección de los datos personales y financieros de los usuarios, según los criterios normativos y de seguridad establecidos en la documentación del proyecto.

Estructura de desglose de trabajo (E.D.T.) del proyecto GastoSmart:

La lectura automática de notificaciones queda fuera de esta estructura porque está excluida del alcance actual.

E.D.T:

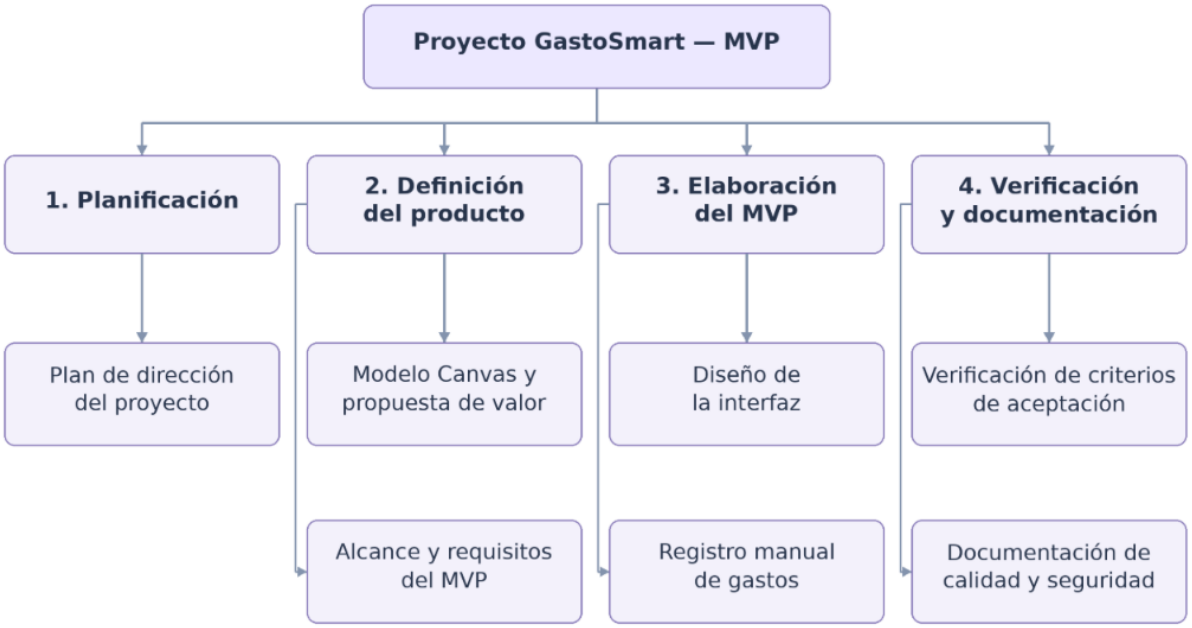

Cronograma de Actividades. Tiempo/Persona humana:

Actividades	**% de importancia / impacto**	**Entregable / Producto**	**Fecha de inicio.**	**Fecha de fin.**
Definir el modelo de negocio y la propuesta de valor.	15%	Modelo Canvas de GastoSmart.	05/10/2026	20/10/206
Definir el alcance y los requisitos del MVP.	15%	Alcance del proyecto y del producto, exclusiones y restricciones.	12/10/2026	27/10/2026

Elaborar la planificación del proyecto.	15%	Plan de dirección, EDT, cronograma y matriz RACI.	19/10/2026	03/11/2026
Diseñar la interfaz del MVP.	20%	Diseño de las pantallas del MVP.	28/10/2026	17/11/2026
Elaborar el MVP con registro manual de gastos.	20%	MVP de GastoSmart.	Por definir…	Por definir…
Verificar el MVP y completar la documentación de calidad y seguridad.	15%	Registro de verificación y documentación del proyecto.	Por definir…	Por definir…
TOTAL	100%	Base 1	Cronograma 1	Cronograma 2

Matriz RACI. Responsabilidad de los integrantes del cronograma de actividades.

R — Responsable: realiza la actividad.
A — Aprobador: aprueba o rechaza el resultado.
C — Consultado: aporta información o conocimientos.
I — Informado: recibe información sobre el avance.

CÓDIGO	**INTEGRANTE**
TA	Tomás Andres
OC	Omar Contreras
PR	Paul Romero
FA	Fernando Adaro
GR	Gustavo Rodriguez
AS	Agustín Santarena
GS	Gabriel Santarena
SM	Santiago Martín
NS	Nahuel Spikerman

MATRIZ RACI

Actividad	**TA**	**OC**	**PR**	**FA**	**GR**	**AS**	**GS**	**SM**	**NS**
1. Definir el modelo de negocio y la propuesta de valor.	A	C	R	I	R	C	I	I	C
2. Definir el alcance y los requisitos del MVP.	A	R	C	C	I	R	I	C	I
3. Elaborar la planificación del proyecto.	A/R	R	I	I	C	I	C	I	I
4. Diseñar la interfaz del MVP.	A	C	C	I	I	C	R	R	I
5. Elaborar el MVP con registro manual de gastos.	A	C	I	R	C	I	C	C	R
6. Verificar el MVP y completar la documentación de calidad y seguridad.	A	R	C	C	R	C	I	I	C

PLAN DE COMUNICACIÓN:

Interesados	Información requerida	Frecuencia	Responsable de comunicación	Medio	Nivel de impacto
Tomás Andrés Responsable del proyecto	Avance de las actividades, dificultades y tareas pendientes.	Semanal y cuando surja un bloqueo.	Integrantes responsables de cada actividad.	Grupo de WhatsApp y reunión virtual.	Alto
Equipo QWERTY123	Distribución de tareas, fechas previstas y cambios aprobados en la planificación.	Semanal y ante cambios.	Tomás Andrés.	Grupo de WhatsApp y documentos compartidos.	Alto
Integrantes encargados del diseño y elaboración del MVP	Requisitos, características del producto y criterios de aceptación acordados.	Al iniciar cada actividad y ante cambios aprobados.	Omar Contreras y Agustín Santarena Gabriel Santarena. Nahuel Spikerman.	Documentos compartidos y reunión virtual.	Alto
Integrantes encargados de la verificación y documentación	Entregables disponibles, resultados de las verificaciones y correcciones pendientes.	Al finalizar cada entregable.	Santiago Martin. Gustavo Rodriguez Paul Romero Fernando Adaro.	Documentos compartidos y grupo de WhatsApp.	Alto

RIESGOS:

Riesgo	Descripción	Probabilidad (10–100)	Impacto (10–100)
Retraso en las actividades	La disponibilidad limitada de los integrantes o las dificultades de las tareas podrían retrasar los entregables del cronograma.	60	80
Falta de coordinación del equipo	Una comunicación insuficiente podría generar tareas duplicadas, actividades pendientes o diferencias entre los entregables.	40	70
Cambios en los requisitos del MVP	Incorporar nuevas características después de definir el alcance podría aumentar el trabajo y modificar los plazos previstos.	50	80
Dificultades técnicas	La falta de experiencia con alguna herramienta o tecnología podría dificultar la elaboración del MVP.	60	70
Pérdida de archivos o versiones	La eliminación accidental de archivos o la falta de respaldos podría provocar pérdida de trabajo y documentación.	30	90
Exposición de información personal o financiera	El uso de datos reales en pruebas o un control de acceso insuficiente podría permitir que personas no autorizadas accedan a información de los usuarios.	30	100

Incumplimiento de los criterios de aceptación	El MVP o la documentación podrían presentar errores u omisiones que requieran correcciones antes de su aprobación.	40	80

FIRMAS:

Nombre	**Cargo o rol del Proyecto.**	**Creador /Revisor/ Aprobador.**	**Fecha**	**Firma**
Omar Contreras	Integrante - Elaboración del documento.	Creador.	A completar al firmar.	
Paul Romero	Integrante - Revisión del documento.	Revisor	A completar al firmar.	
Tomás Andres	Responsable del Proyecto	Aprobador	A completar al firmar.	
